Provincia di Ancona
SETTORE III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'OPERA D'ARTE (PONTE N. 178) SULLA S.P. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 24+225 SUL TORRENTE NEVOLA - COD. INT. 80.02

CUP: H61B19000370003 - CIG: 85379191A6

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

Cronoprogramma

Visti:

Andrea Spada
26.03.2025
18:32:06
GMT+01:00

ALFONSO SORRENTO
08.07.2024
08:32:33
GMT+01:00

Monica Ulissi
11.06.2025
08:04:18
GMT+01:00

Impresa Appaltatrice — ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.

Consorziata Esecutrice — CIANTARTI INFRASTRUTTURE EVOLUTE

Impresa Appaltatrice: **CONSORZIO ACREIDE** s.c.a.r.l.
sede: Via Michelangelo Buonarroti n. 56, Zola Predosa (BO)
C.F./P.IVA : 03811731201

Responsabile dell'Area e R.
Ing. Giacomo Dolciotti

Direttore dei Lavori :
Ing. Stefano Vignati

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:
Arch. Alfonso Sorrento (Capogruppo-Mandatario)
Ing. Marco Santangelo (Mandante)
Ing. Luigi Fazio (Mandante)
Ing. Giuseppe Montecristo (Mandante)
Ing. Antonino Carmelo Milazzo (Mandante)

Consulenza Strutturale
Ing. Nicola Del Ciotto (società Valeo s.r.l.)

Staff di Progettazione :
Ing. Giuseppe Riggio
Geom. Enrico Leonardi

argomento tavola:

ELABORATI AMMINISTRATIVI

data:	revisione:	scala:
Gennaio 2024		

elaborato:	allegato / tavola :
7	**7 - AMM**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavori di adeguamento dell'opera d'arte (Ponte n°1 78) sulla S.P. 18 "Jesi-Monterado" al Km 24+225 sul Torrente Nevola - cod. Int. 80.02

Progressione temporale dei lavori (DURATA LAVORI 480 gg)

Fase	Descrizione delle principali fasi di intervento
0	**CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA**
	0.1 - Sistemazione terreno (Rampe provvisorie e piste)
	0.2 - Recinzioni di cantiere
	0.3 - Baraccamenti
	0.4 - Impianti di cantiere
	0.4 - Infissione palancole
	0.6 - Piattaforma costruzione ponte e geotessile
1	**DEMOLIZIONE/RIMOZIONI**
	1.1 - Taglio asfalto
	1.2 - Demolizioni muri spalle
	1.3 - Demolizione impalcato
	1.4 - Demolizione spalle
	1.5 - Rimozione guardrail
	1.6 - Demolizione sede stradale
2	**SCAVI**
	2.1 - Spalle
	2.2 - Riprofilazione sponde
3	**POSIZIONAMENTO PROLUNGHE PILE ESISTENTI**
4	**REALIZZAZIONE NUOVO PONTE**
	4.1 - Pali di fondazione
	4.2 - Realizzazione spalle
	4.3 - Realizzazione impalcato
	4.4 - Realizzazione soletta
	4.5 - Realizzazione sbalzi
	4.6 - Realizzazione Cordoli
5	**RACCORDI**
	5.1 - Pali
	5.2 - Cordoli
	5.3 - Muri
	5.4 - Marciapiede/pista ciclabile
6	**RINTERRI**
7	**ULTERIORI DEMOLIZIONI/SMONTAGGI**
	7.1 - Smontaggio prolunghe da pile esitenti
	7.2- Demolizioni pile esitenti
8	**IMPIANTI**
	8.1 - Cavidotto e tubazioni varie
	8.2 - Plinti per pali illuminazione
	8.2 - Pali illuminazione ed armatura stradale
9	**SISTEMAZIONE CARREGGIATE**
	9.1 - Fresatura asfalto fino alla rotonda
	9.2 - Realizzazione rilevato stradale
	9.3 - Asfalto
	9.4 - Guard rail
	9.5 - Segnaletica stradale
10	**SISTEMAZIONI ARGINI**
	10.1 - Estrazione palancole
	10.2 - Scavo in golena e scavo sotto ponte per risagomatura
	10.3 - Realizzazione argini
	10.4 - Formazione di scogliera
	10.5 - Posizionamento di geotessuto/geocomposito e inerbimento con idrosemina
11	**Smobilizzo cantiere**
	11.1 - Smontaggio baraccamenti ed impianti di cantiere
	11.2 - Rimozione rampe provvisorie e piste
	11.3 - Smontaggio recinzione di cantiere

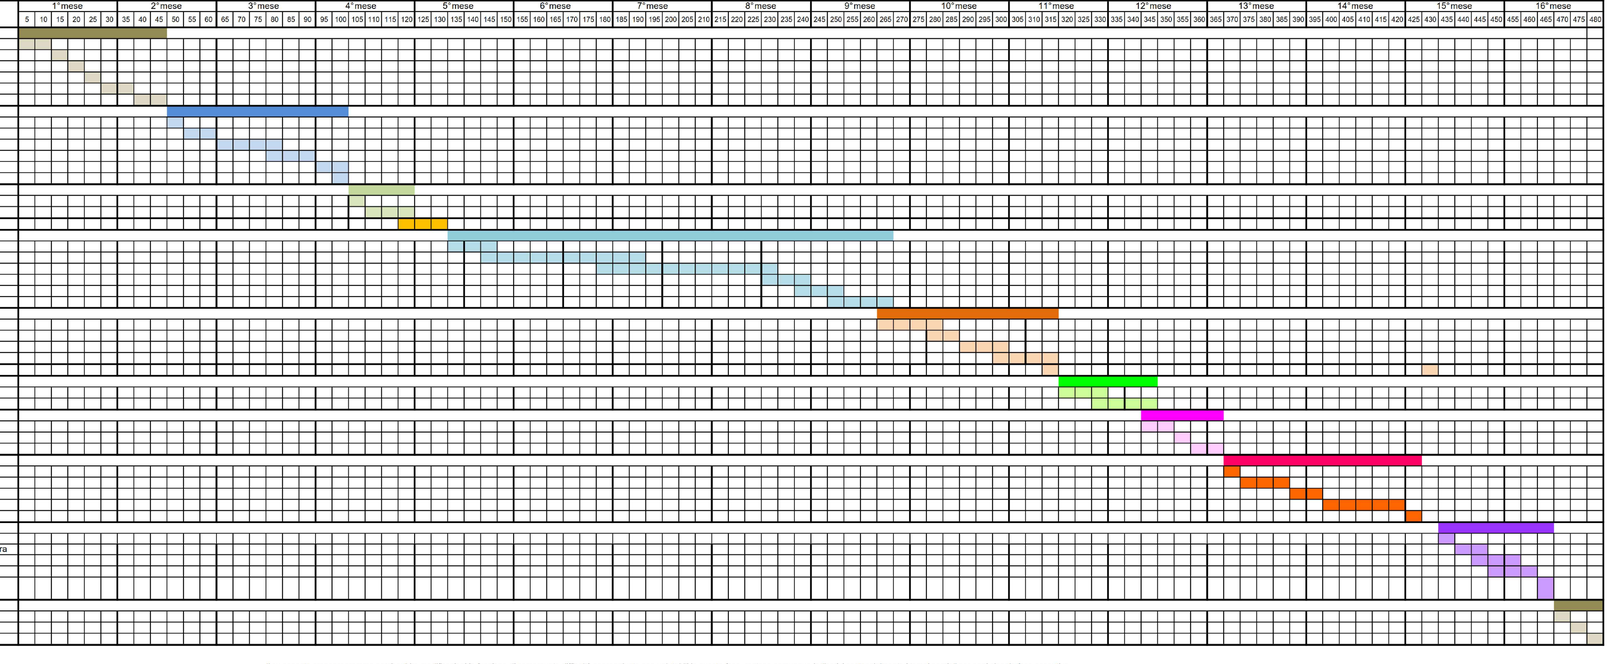

Il su esposto cronoprogramma potrà subire modificazioni in funzione di comprovate difficoltà sopraggiunte non valutabili in questa fase, restano comunque indicativi sostanzialmente i tempi parziali per ogni singola fase esecutiva
